

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: ADI	
Equipo No.: 7	Fecha: 21/05/2025
Número de sesión / Día de trabajo: 1 (realizamos actividades desde antes)	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto Presencial
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Daniela Saray Moran Ochoa	Líder	Sí	Definición de Roles del equipo y Coordinación: Definir claramente las responsabilidades, perfiles y matriz de asignación de responsabilidades de cada miembro del proyecto. Revisión final y unificación del Plan del Proyecto.	Documento con la descripción de los roles y responsabilidades . Plan del Proyecto integrado.
Diego Romo Muñoz	Desarrollador	Sí	Desarrollo de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Identificar y desglosar jerárquicamente todas las fases, entregables y paquetes de trabajo del proyecto (incluyendo módulos de procesamiento, lectores de archivos, etc.).	Diagrama de la EDT (puede ser en formato gráfico o esquema de lista en Word).
Ángel Enrique Chavez Ponce	Desarrollador	Sí	Elaboración del Cronograma (Fechas y duración): Tomar	Diagrama de Gantt o cronograma

			los paquetes de trabajo de la EDT y estimar el tiempo de cada tarea, definiendo fechas de inicio y fin para la integración de APIs y desarrollo general.	detallado (puede ser en Excel, MS Project o herramienta similar).
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador	Sí	Consolidación del Cronograma (Responsables y dependencias): Asignar a los responsables específicos para cada tarea en el cronograma, validar las dependencias técnicas entre actividades (ej. qué partes de la base de datos deben estar listas antes de avanzar) y asegurar la viabilidad operativa.	Tabla de hitos y cronograma actualizado con asignación de responsables y dependencias técnicas.

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Definición de Roles del Equipo (8.3) y Coordinación del Plan	Daniela Saray Moran Ochoa	08:00 a.m.	09:00 a.m.	En proceso
Diseño de la EDT - Estructura de Desglose del Trabajo (8.1)	Ángel Enrique Chavez Ponce	08:00 a.m.	09:00 a.m.	En proceso
Creación del Cronograma: Fechas y Duración (8.2)	Diego Romo Muñoz	08:00 a.m.	09:00 a.m.	En proceso


Consolidación del Cronograma: Dependencias y Responsables (8.2)	Alan Noe Guzmán Lizaran	08:00 a.m.	09:00 a.m.	En proceso
---	-------------------------	------------	------------	------------

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Subestimación de los tiempos de desarrollo: Que las tareas de la EDT tomen más tiempo del planificado en el cronograma.	Tiempo/Costo: Retrasos en las entregas semanales y posible acumulación de trabajo al final.	Preventiva: Agregar un margen de tiempo (buffer) del 15% a las tareas de mayor complejidad técnica y hacer revisiones de avance rápidas cada inicio de semana.
Cuellos de botella por dependencias técnicas: Que un desarrollador no pueda avanzar porque depende del código de otro (ej. esperar la base de datos para conectar los lectores).	Tiempo: Bloqueo operativo de los miembros del equipo, alargando el cronograma.	Preventiva: Trabajar con datos simulados (mocks o JSONs temporales) para que los desarrollos puedan avanzar en paralelo sin depender estrictamente del módulo anterior.

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
<https://drive.google.com/drive/folders/1iJC0DTtS4InToKFdcs2aluXJNoq-1KsZ?usp=sharing>
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos

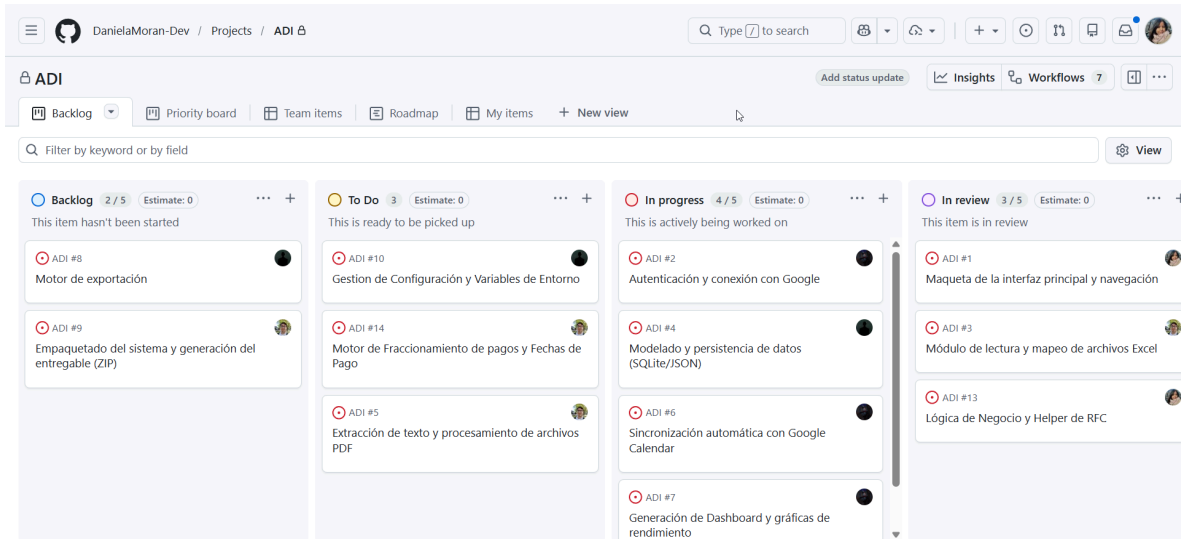

Nivel 1 – Grupo	Nivel 2 – Subgrupo	Nivel 3 – Paquete de trabajo	Responsable	Entregable
1. Inicio y análisis	1.1 Resumen ejecutivo	1.1.1 Objetivo y beneficios del sistema	Todo el equipo	Resumen 1 pág.
		1.1.2 Costo estimado y duración	Alan G.	Estimación de costos
	1.2 Descripción del proyecto	1.2.1 Problema y objetivo general	Daniela M.	Doc. de problema
		1.2.2 Alcance y stakeholders	Diego R.	Alcance definido
	1.3 Análisis de negocio	1.3.1 Estudio de mercado (CRM)	Angel Ch.	Análisis competencia
		1.3.2 Competencia y justificación	Daniela M.	Justificación doc.
2. Factibilidad y requerim.	2.1 Factibilidad	2.1.1 Factibilidad técnica	Angel Ch.	Estudio técnico
		2.1.2 Factibilidad económica	Alan G.	Análisis de costos

		2.1.3 Factibilidad operacional	Diego R.	Factibilidad op.
	2.2 Req. funcionales	2.2.1 Importación Excel / PDF	Angel Ch.	Módulo importación
		2.2.2 Sincronización Google Calendar	Daniela M.	Módulo Calendar
		2.2.3 Dashboard de ventas	Diego R.	Dashboard funcional
	2.3 Req. no funcionales	2.3.1 Interfaz accesible e intuitiva	Todo el equipo	Criterios UX
3. Planeación y estimación	3.1 Metodología	3.1.1 Agile-Scrum / GitHub Projects	Diego R.	Plan metodología
		3.1.2 Fases y sprints definidos	Todo el equipo	Backlog GitHub
	3.2 Estimación	3.2.1 Puntos de función	Alan G.	Tabla estimación
		3.2.2 Horas estimadas por rol	Todo el equipo	Asignación horas
	3.3 Plan del proyecto	3.3.1 EDT completo	Daniela M.	Este documento
		3.3.2 Cronograma y roles del equipo	Diego R.	Cronograma Gantt
4. Ejecución del proyecto	4.1 Avances reales	4.1.1 Avances reales por sprint	Todo el equipo	Bitácora sprints
		4.1.2 Actividades realizadas	Todo el equipo	Registro GitHub
	4.2 Prototipo / módulos	4.2.1 Maqueta interfaz y navegación (ADI #1)	Daniela M.	Prototipo visual
		4.2.2 Módulo importación Excel (ADI #3)	Angel Ch.	Módulo Excel
		4.2.3 Extracción y procesamiento PDF (ADI #5)	Angel Ch.	Módulo PDF
		4.2.4 Autenticación y conexión Google (ADI #2)	Diego R.	Auth Google
		4.2.5 Sincronización Google Calendar (ADI #6)	Diego R.	Calendar sync
		4.2.6 Modelado y persistencia datos (ADI #4)	Alan G.	BD SQLite/JSON
		4.2.7 Dashboard y gráficas (ADI #7)	Daniela M.	Dashboard
		4.2.8 Motor de exportación (ADI #8)	Alan G.	Exportación mensual
		4.2.9 Lógica pagos y RFC (ADI #13/14)	Angel Ch.	Lógica de negocio

	4.3 Trabajo por sprints	4.3.1 Sprint 1 – UI y autenticación	Daniela / Diego	Prototipo + auth
		4.3.2 Sprint 2 – Datos y BD	Alan / Angel	Módulos datos
		4.3.3 Sprint 3 – Automatización Calendar	Diego / Angel	Calendar activo
		4.3.4 Sprint 4 – Reportes y Dashboard	Daniela / Alan	Dashboard listo
		4.3.5 Sprint 5 – Empaquetado y entrega	Todo el equipo	ZIP entregable
5. Control y calidad	5.1 EVM	5.1.1 Variación de esfuerzo	Alan G.	Informe EVM
		5.1.2 Avance real vs esperado	Alan G.	Métricas avance
		5.1.3 Productividad y densidad defectos	Todo el equipo	Reporte calidad
	5.2 Gestión de riesgos	5.2.1 Identificación de riesgos	Diego R.	Mapa de riesgos
		5.2.2 Plan de mitigación	Diego R.	Plan mitigación
		5.2.3 Monitoreo continuo de riesgos	Todo el equipo	Log de riesgos
	5.3 Gestión de calidad	5.3.1 Revisiones de código (code review)	Angel Ch.	Checklist código
		5.3.2 Pruebas funcionales y checklists	Daniela M.	Casos de prueba
		5.3.3 Documento gestión de calidad	Todo el equipo	Doc. calidad
6. Cierre del proyecto	6.1 Conclusiones	6.1.1 Resultados obtenidos	Todo el equipo	Informe final
		6.1.2 Problemas encontrados	Todo el equipo	Lecciones aprendidas
		6.1.3 Recomendaciones	Todo el equipo	Recomendaciones
	6.2 Entrega final	6.2.1 Empaquetado sistema ZIP (ADI #9)	Alan G.	App instalable
		6.2.2 Sistema instalable operativo	Todo el equipo	Entregable final
	6.3 Anexos	6.3.1 Documentación técnica	Angel / Diego	Manual técnico
		6.3.2 Glosario y referencias	Daniela M.	Glosario
		6.3.3 Restricciones API Google Calendar	Alan G.	Anexo restricciones

Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Diego Romo Muñoz	Integración de API's	25%	10
Ángel Enrique Chavez Ponce	Creación de lectores de Excel y pdf para el procesamiento de información	25%	10
Alan Noe Guzmán Lizaran	Creación de la base de datos	25%	10
